PLANO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES
PIE 2022

ASPLEL -
SETEMBRO 2021

PLANO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES - PIE

LEMBRANDO: O PROCESSO "PLANEJAMENTO DA ELEIÇÃO" FOI OBJETO DE MELHORIA EM 2019, QUE TEVE COMO ESCOPO A ELABORAÇÃO DE UM PIE MAIS ENXUTO.

PLANO INTEGRADO DAS ELEIÇÕES - PIE

INSTRUMENTO DE GESTÃO

OBJETIVO: ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PRINCIPAIS ETAPAS DAS ELEIÇÕES PELA ADMINISTRAÇÃO

DEIXOU DE TER COMO OBJETIVO A PREVISÃO DE TODAS AS ATIVIDADES QUE DEVEM SER DESENVOLVIDAS EM CADA UM DO PROCESSOS DE TRABALHO PREVISTOS NO PLANO

RADS

EM 2020, A ASPLEL PASSOU A SER UNIDADE GESTORA DO PROCESSO "PLANEJAMENTO DE ELEIÇÕES"

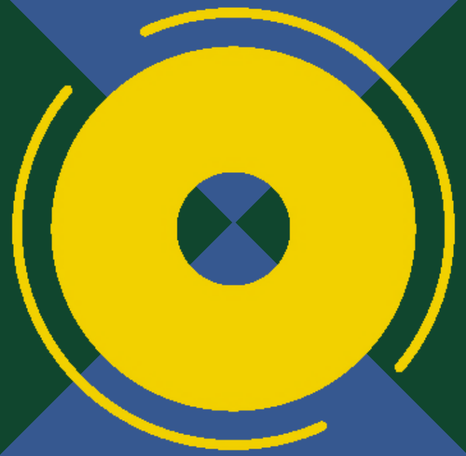

COMO FOI PLANEJADA A CONSTRUÇÃO DO PIE 2022?

1) **CONSTRUÇÃO FOCADA NAS ENTREGAS -** ALINHAMENTO COM O NOVO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO (ALTERAÇÃO DA FORMA DE MEDIÇÃO DO ANTIGO IA-26);

2) **CRIAÇÃO DE UM NOVO GRUPO PARA ABRIGAR TODAS AS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL RELACIONADAS AO PROCESSO ELEITORAL** – OBJETIVO: CONSOLIDAR EM UM DOCUMENTO ÚNICO AS ENTREGAS/TAREFAS E AÇÕES DE COMUNICAÇÃO PARA OS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO;

COMO FOI PLANEJADA A CONSTRUÇÃO DO PIE 2022?

3) PARTICIPAÇÃO DE GESTORES(AS) E DE SERVIDORES(AS) REPRESENTANTES DAS ÁREAS TÉCNICAS E DE ZONAS ELEITORAIS;

4) COORDENAÇÃO DE TODO O TRABALHO DA CONSTRUÇÃO DO PIE PELA ASPLEL

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

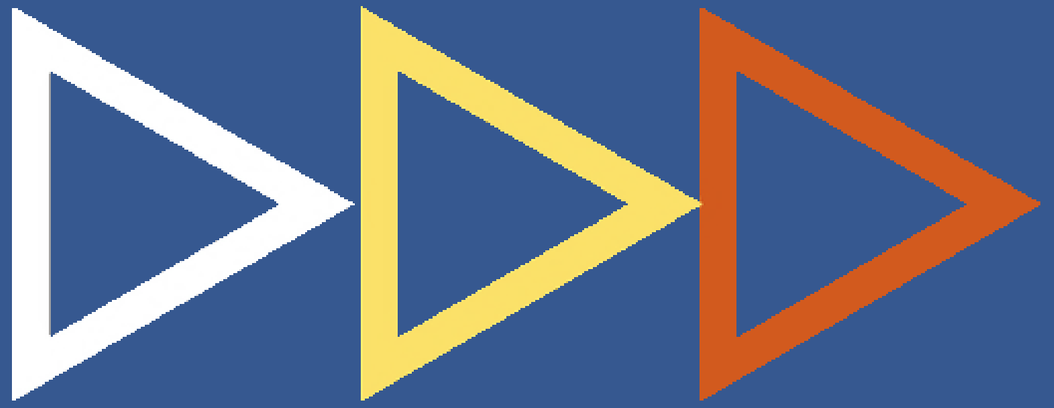

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

1 – ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E DA PROPOSTA DE ESTRUTURA MÍNIMA DO PIE 2022 (GRUPOS E SUBGRUPOS) PELA ASPLEL
CONCLUSÃO: MAIO/2021

2 - MANIFESTAÇÃO DAS UNIDADES SOBRE A PROPOSTA DE ESTRUTURA MÍNIMA (GRUPOS E SUBGRUPOS) DO PIE 2022
CONCLUSÃO: MAIO/2021

3– APROVAÇÃO DA ESTRUTURA MÍNIMA DO PIE 2022 (GRUPOS, SUBGRUPOS E SEUS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS) PELA PRESIDÊNCIA
CONCLUSÃO: JUNHO/2021

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

4- FORMAÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO QUE ATUARIAM NA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022 (GRUPOS TEMÁTICOS)
CONCLUSÃO: JUNHO/2021

5- REUNIÃO DA DG, COM PARTICIPAÇÃO DA ASPLEL E COSOC, E TODOS(AS) INTEGRANTES DOS GRUPOS TEMÁTICOS, PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE AS ETAPAS E CRITÉRIOS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022 (PADRONIZAÇÃO DA SEMÂNTICA E DOS CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS PARA DEFINIÇÃO DAS UNIDADES RESPONSÁVEIS PELAS ENTREGAS E TAREFAS)
CONCLUSÃO: JUNHO/2021

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

6 – DEFINIÇÃO E REGISTRO NO PIE 2022 DAS ENTREGAS DE CADA SUBGRUPO, COM PRAZOS E RESPONSÁVEIS
CONCLUSÃO: JULHO/2021

7- ANÁLISE, PELA DG, DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS GTS
CONCLUSÃO: JULHO/2021

8– REUNIÕES DA ASPLEL COM OS COORDENADORES DOS GRUPOS TEMÁTICOS PARA O ALINHAMENTO DAS ENTREGAS, CONFORME ANÁLISE FEITA PELA DG
CONCLUSÃO: JULHO/2021

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

9– DEFINIÇÃO E REGISTRO NO PIE 2022 DAS TAREFAS –ETAPAS NECESSÁRIAS PARA GARANTIR QUE AS ENTREGAS OCORRAM NO PRAZO PREVIAMENTE DEFINIDO.

CONCLUSÃO: AGOSTO/2021

10– IDENTIFICAÇÃO E ENCAMINHAMENTO À COSOC DAS ENTREGAS E TAREFAS QUE OS GRUPOS TEMÁTICOS CONSIDERARAM IMPORTANTES SEREM OBJETO DE AÇÕES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA OS PÚBLICOS EXTERNO E INTERNO – GRUPO 8

CONCLUSÃO: AGOSTO/2021

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

11– ANÁLISE, PELAS UNIDADES DO TRIBUNAL (ZES E SEDE), DA PROPOSTA DO PIE 2022 ELABORADA PELOS GTS E EVENTUAL ENCAMINHAMENTO DE SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO/INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE ENTREGAS E TAREFAS E PRAZOS PREVISTOS - AVISO DG 12/2021

CONCLUSÃO: AGOSTO/2021

12- ANÁLISE, ALINHAMENTO COM OS GTS E ESTRUTURAÇÃO DO GRUPO 8 PELA COSOC

CONCLUSÃO: SETEMBRO/2021

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO DO PIE 2022

13- ANÁLISE DAS SUGESTÕES ENCAMINHADAS E DA ESTRUTURA DO PIE 2022 CONSTRUÍDO PELOS GTS PELA DG E DEFINIÇÃO DA PROPOSTA FINAL DO PLANO A SER SUBMETIDA À AVALIAÇÃO DO CGE.

CONCLUSÃO: SETEMBRO 2021

OBS: ATÉ O MOMENTO TODAS AS ETAPAS FORAM EXECUTADAS CONFORME OS PRAZOS PLANEJADOS.

PRÓXIMOS PASSOS

1 - Análise pelo CGE da proposta do PIE 2022
Prazo até 24/09/2021

2 – Aprovação e publicação do PIE 2022 pela Presidência
Prazo até 30/09/2021

3 - Revisão do PIE após a publicação pelo TSE das Resoluções relacionadas às Eleições 2022
Prazo a partir de janeiro/2022

MUITO OBRIGADA E UM ÓTIMO TRABALHO PARA TODAS E TODOS NÓS!

ASPLEL
